



**Realisatieovereenkomst behorende bij
Overeenkomst met
zaaknummer : 31146171**

behorend bij de te gunnen Overeenkomst
inzake DECODE, revisie deel
DEballaststelsysteem Maeslantkering,
CONserveringswerkzaamheden binnenzijde
drijflichamen Maeslantkering met het DoEn
gedachtegoed.



DECODE

Ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud, de heer T.R. Roozendaal, hierna te noemen: "Opdrachtgever",

en

2. Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf B.V. gevestigd te Ochten, vertegenwoordigd door de heer N.H. van Schenkhof, hierna te noemen: "Opdrachtnemer",

hierna gezamenlijk ook te noemen: "Partijen",

overwegende dat:


- a. de Opdrachtgever in het kader van het Project DECODE een voorlopige gunningsbeslissing heeft uitgesproken ten gunste van beoogd Opdrachtnemer. Dit na het succesvol doorlopen van Fase 3 binnen de aanbestedingsprocedure, betreffende de concurrentiegerichte dialoog, inschrijving en pre-award;
- b. Partijen in goede samenwerking met elkaar en met de Klant in fase 4 de Realisatieovereenkomst hebben uitgewerkt;
- c. De 5 principes van het DOEN gedachtegoed, optimale samenwerking, werken vanuit de bedoeling, maximale klantwaarde, eerlijk geld voor eerlijk werk en leren, leidend zijn geweest in het tot stand komen van de Realisatieovereenkomst
- d. Opdrachtnemer als onderaannemer Mourik Infra inzet voor het project DECODE
- e. Een aantal werknemers van Mourik Infra onderdeel uitmaken van het projectteam DECODE.
- f. Partijen hebben voldaan aan de in de Aanbestedingsleidraad gestelde voorwaarden m.b.t. het afronden van fase 4 en het komen tot een definitieve gunning;
- g. Afwijkingen van de onder f bedoelde voorwaarden zijn onderbouwd opgenomen in de documenten behorende bij deze Realisatieovereenkomst
- h. De door Partijen gesloten Faseovereenkomst met ondertekening van de Realisatieovereenkomst als afgerond kan worden beschouwd.
- i. Partijen de goede samenwerking zoals opgebouwd tijdens de aanbesteding en specifiek in fase 4 in het kader van het gedachtegoed Doen wensen voort te zetten en verder uit te bouwen;
- j. De Realisatieovereenkomst is opgezet als een Documentenlijst;



verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1 Overeenkomst

1.1 Partijen conformeren zich aan het gestelde in de documenten zoals hieronder gevisualiseerd en beschreven:

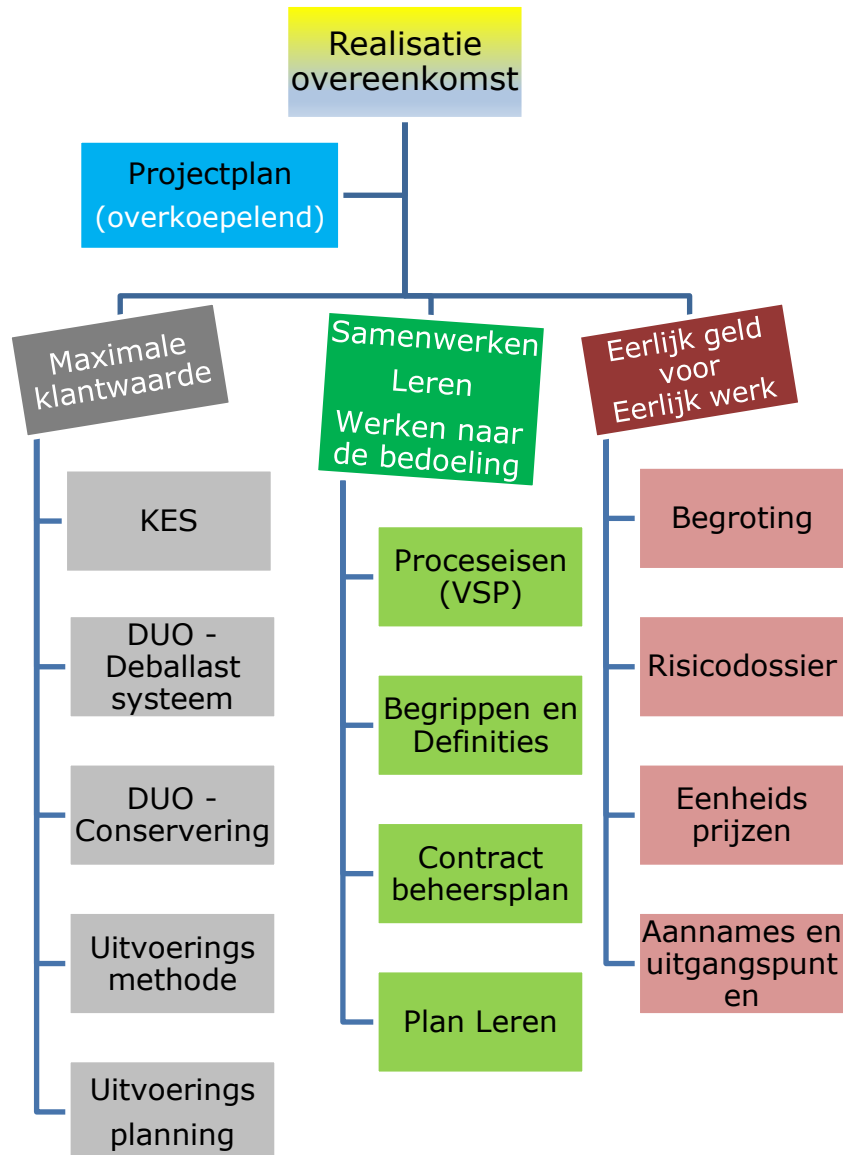

Document	Versie	Korte omschrijving
Projectplan	1.0 d.d. 11 mei 2021	Het projectplan beschrijft in hoofdlijnen de 3 P's die van belang zijn voor het project DECODE. P1. De personen, welke personen zijn onderdeel van het projectteam DECODE. P2 De Processen. Welke processen zijn leidend voor het projectteam DECODE. P3 De Producten: welke producten levert het projectteam DECODE op. Het projectplan beschrijft voorts op hoofdlijnen hoe het projectteam DECODE invulling geeft aan de 5 principes van het DOEN-gedachtengoed. Het projectplan beschrijft ook in hoofdlijnen hoe Projectteam DECODE het project DECODE gaat beheersen.
KES	3.0 d.d. 22 april 2021	KlantEisenSpecificatie bestaat uit een oplegnotitie, het KES document en een traceerbaarheidsmatrix. De KES beschrijft alle eisen en behoeften die bij de Klant zijn opgehaald, welke eisen en behoeften gehonoreerd zijn en welke niet en waarom niet. De KES vormt de basis voor de verdere invulling van Maximale klantwaarde.
Definitief uitvoeringsontwerp (DUO) Conserveren	1.0 d.d. 7 mei 2021	Het definitief uitvoeringsontwerp conserveren beschrijft <u>wat</u> projectteam DECODE gaat DOEN met betrekking tot conserveren van de binnenzijde van de drijflichamen van de Maeslantkering. Het DUO conserveren beschrijft o.a. hoeveel m2 het Projectteam DECODE gaat stralen, overlagen en schilderen. Daarbij zijn de klantwaarden (KES) gevalideerd en geverifieerd en zijn de afwegingen traceerbaar vastgelegd. Het DUO conserveren beschrijft de meest risicovolle en kostenbepalende keuzes die zijn gemaakt. Denk hierbij aan; vaststellen van conserveringssysteem en het steigerwerk.
Definitief uitvoeringsontwerp (DUO) Deballastsysteem	1.0 d.d. 23 april 2021	Het definitief uitvoeringsontwerp Deballastsysteem beschrijft <u>wat</u> projectteam DECODE gaat DOEN met betrekking tot het Deballastsysteem van de Maeslantkering. Het DUO Deballastsysteem beschrijft o.a. welke onderdelen van het Deballastsysteem gereviseerd worden en welke onderdelen vervangen worden.



		<p>Daarbij zijn de klantwaarden (KES) gevalideerd en geverifieerd en zijn de afwegingen traceerbaar vastgelegd.</p> <p>Het DUO Deballastsysteem beschrijft de meest risicovolle en kostenbepalende keuzes die zijn gemaakt. Denk hierbij aan; vaststellen van type pomp inclusief ondersteuningsconstructie.</p>
Uitvoeringsmethode	1.0 d.d. 6 mei 2021	<p>De uitvoeringsmethode beschrijft hoe Projectteam DECODE het DUO gaat realiseren.</p> <p>De uitvoeringsmethode beschrijft o.a. de volgorde van de werkzaamheden, het ontwerp van en de hoeveelheid in te zetten hulpconstructies en de beheersing van de risico's.</p> <p>Daarbij zijn de klantwaarden gevalideerd en geverifieerd en zijn de kwaliteit en (veiligheids) risico's traceerbaar vastgelegd.</p>
Uitvoeringsplanning	1.0 d.d. 6 mei 2021	<p>De uitvoeringsplanning beschrijft op hoofdlijnen wanneer het Projectteam DECODE wat (DUO) gaan uitvoeren. Het gaat daarbij om de fasen ontwerpen, voorbereiding en uitvoering. Verder beschrijft de uitvoeringsplanning welke compartimenten in welke uitvoeringsjaren kunnen worden uitgevoerd.</p>
Proceseisen VSP	1.0 d.d. 26 april 2021	<p>De Vraagspecificatieproces beschrijft welke eisen door Projectteam DECODE van belang worden geacht voor het uitvoeren van de Werkzaamheden, de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten.</p>
Begrippen en Definities	1.0 d.d. 17 mei 2021	<p>Dit document beschrijft welke begrippen er door Projectteam DECODE worden gebruikt en welke definities deze begrippen in het kader van deze overeenkomst hebben.</p>
Contractbeheersplan (CBP)	2.0 d.d. 26 april 2021	<p>Het CBP beschrijft op welke wijze het projectteam DECODE zeker stelt dat de resultaten (Maximale klantwaarde) voldoen aan de gestelde eisen in de overeenkomst. Het zekerstellen vormt de basis voor het kunnen doen van een rechtmatige betaling. Door in te vulling te geven aan het CBP wordt het DOEN principe "eerlijk geld voor eerlijk werk" geborgd.</p>
Plan Leren	1.0 d.d. 3 maart 2021	<p>Het plan leren beschrijft op welke wijze Projectteam DECODE invulling aan het DOEN principe "leren". Waar worden geleerde lessen vastgelegd en op welke wijze worden ze geborgd.</p>
Begroting	X d.d. 4 mei 2021	<p>De begroting is de vaste prijs voor het uitvoeren van het Werk, inclusief risico's en aannames en uitgangspunten, met een variatiecoëfficiënt van 10%. De begroting is</p>



		getoetst en akkoord bevinden door de kostenpoule van RWS. In de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen vaste prijs en WRAK. Waarbij de risico's en aannames integraal onderdeel uitmaken van het tot stand komen van de vaste prijs. De in de menukaart aangeboden en later afgestemde prijzen vormen de basis voor de begroting.
Eenheidsprijzen	1.0 d.d. 4 mei 2021	Dit document is een lijst met prijzen eerlijk geld voor eerlijk werk Dit betreft een lijst met prijzen die onderdeel uitmaakt van de begroting. De lijst bevat o.a. de gehanteerde uurtarieven en bijbehorende rollen.
Risicodossier	1.0 d.d. 22 april 2021	Dit document is een gekwantificeerd risicodossier met risicoverdeling. Dit dossier dient als input voor de begroting en geeft inzicht bij welke partij risico's belegd zijn, dan wel hoe de risico's onder Partijen zijn verdeeld.
Aannames en uitgangspunten	1.0 d.d. 17 mei 2021	Dit document beschrijft met welke aannames er is gerekend bij het opstellen van de begroting. In de begrippenlijst is uitgelegd wat er in het project DECODE wordt bedoeld met aannames en uitgangspunten.
UAV-Gc 2005	n.v.t.	Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde contracten 2005. De UAV-Gc 2005 heeft als basis gediend bij het opstellen van de documenten van de RealisatieOvereenkomst.

- 1.2 Daarbij geldt dat Partijen verantwoordelijk zijn voor dat deel waar ze uit de aard van hun organisatie logischerwijs verantwoordelijk voor zijn. Met dien verstande dat het Werk in de basis tot de verplichting van de Opdrachtnemer behoort en de Opdrachtgever de verplichting heeft te betalen voor het uitgevoerde Werk. Omdat deze tekst best vaag is, is de verdere uitwerking van het bovenstaande opgenomen in de documenten zoals genoemd in artikel 1.1.
- 1.3 Bij onderlinge tegenstrijdigheden in bovenstaande documenten treden Partijen met elkaar in overleg en wordt in gezamenlijkheid bepaald wat de bedoeling is geweest van de documenten en de tekst. De uitkomst van dit overleg wordt vervolgens vastgesteld en vastgelegd. De uitkomst is vanaf moment van vastleggen leidend.
- 1.4 Conform het gestelde in de aanbestedingsleidraad is de UAV-Gc de basis voor de opgestelde documenten.
- 1.5 De afspraken die specifiek voor project DECODE zijn gemaakt gaan boven het gestelde in de UAV-Gc 2005.



Artikel 2 Toepasselijk recht

2.1 Op deze Realisatieovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 Inwerkingtreding en duur

- 3.1 Deze Realisatieovereenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening door Partijen
- 3.2 Het Werk dient met inachtneming van het gestelde in de documenten zoals benoemd in artikel 1.1 te worden gerealiseerd zodanig dat het gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk 31 december 2024. Deze datum wordt aangemerkt als de uiterste datum van oplevering.
- 3.3 Elk uitvoeringsjaar dienen onderdelen van het Werk, e.e.a. overeenkomstig het gestelde in de Uitvoeringsplanning te worden gerealiseerd zodanig dat ze gereed zijn voor aanvaarding door de Opdrachtgever.
- 3.4 De Opdrachtgever betaald de Opdrachtnemer voor de realisatie van het Werk, en met inachtneming van het gestelde in de documenten zoals benoemd in artikel 1.1 een bedrag van 16.990.000,- (zestienmiljoen negenhonderdnegentigduizend) EURO exclusief BTW.
- 3.4 In het onder 3.4 genoemde bedrag zijn inbegrepen de kosten voor het uitvoeren van fase 4. Het deel van deze kosten dat al is betaald wordt verrekend met het opstellen van de termijnstaat.
- 3.5 Voortvloeiend uit het risicodossier, nummer 35, en aanvullend op het gestelde onder artikel 3.4 bevat de RealisatieOvereenkomst de volgende optie:

Vervangen van de voedingskabels deballaststelsysteem.

De definitieve uitwerking van de optie inclusief de financiële consequenties vindt indien nodig plaats na het sluiten van de RealisatieOvereenkomst.



Artikel 4 Geheimhouding

4.1 De door of namens Opdrachtnemer en Opdrachtgever in te zetten werknemers verklaren geheim te houden alle informatie voortvloeiende uit deze RealisatieOvereenkomst waarvan zij weten of vermoeden dat deze vertrouwelijk is. Persoonsgegevens, financiële gegevens en klantgegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd. Deze informatie wordt niet aan anderen tenzij dit noodzakelijk is en nooit zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer.

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

1. Namens Rijkswaterstaat
te Rotterdam,

op..... (datum)

..... (handtekening)

T.R. Roozendaal,

2. Namens GSB
te Ochten,

op..... (datum)

Nelis
Hendrikus van
Schenkhof

..... (handtekening)

N.H. van Schenkhof

Digitaal ondertekend door Nelis
Hendrikus van Schenkhof
DN: c=NL, ou=Gelders Staalstraat- en
Schilderbedrijf B.V.,
serialNumber=C81049747, sn=van
Schenkhof, givenName=Nelis Hendrikus,
cn=Nelis Hendrikus van Schenkhof
Datum: 2021.05.21 14:53:53 +02'00'

